

Ing. Giovanni Corti

INGEGNERE CIVILE

T 0577 937763 | C 338 6950168 | e-mail [stu\\_corti@fin.it](mailto:stu_corti@fin.it) | pec: [giovanni.corti2@ingpec.eu](mailto:giovanni.corti2@ingpec.eu)  
Via Monte Sabotino n. 60 - 53036 POGGIBONSI (SI) | CF CRTGNN68H24G752D | P.Iva 00916790520



PROGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINA TRIBUNA  
CENTRALE STADIO COMUNALE "S. LOTTI"

Progetto ESECUTIVO

I disegni e ogni parte  
del documento sono  
di proprietà del  
progettista che  
tutelerà i propri diritti  
in sede civile e penale  
a termini di Legge.

COLLABORATORI


COMUNE	Poggibonsi (SI)	DATA:	Ottobre 2019
LOCALITA'	Viale Marconi	Il tecnico Ing. Giovanni Corti	
COMMITTENTE	Comune di Poggibonsi		
ELABORATO	■ CRONOPROGRAMMA		

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (art. 40 D.P.R. 207/2010)

Fase	Tipologia delle lavorazioni									Importo lavorazioni + oneri sicurezza	Incidenza percent.
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	Settimane									€	
<b>I</b>	<b>Apprestam. cantiere, demolizioni e rimozioni</b>										
	1 Allestimento area e apprestamenti (oneri sicurezza)	4.612								4,612.28	3.673%
	2 Oneri sicurezza - Noleggi		1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	8,197.77	6.528%
	3 Rimozioni rivestimenti, controsoff. e pluviali	5.635								5,634.65	4.487%
	4 Distacco impianto elettrico e altoparlanti	0.210								210.00	0.167%
	5 Rimozione solai in laterocemento	6.514								6,514.21	5.187%
<b>II</b>	<b>Esecuz. opere in acciaio, conness., rivestim.</b>										
	6 Posa travi e controventi		13.880	5.949						19,828.51	15.789%
	7 Esecuzione connessioni		3.331	1.428						4,758.70	3.789%
	8 Posa dei pannelli di falda			4.613	3.075					7,688.25	6.122%
	9 Posa dei rivestimenti (lamiere e scossaline)				8.416	8.416				16,832.29	13.403%
<b>III</b>	<b>Esecuzione opere ripristino cls</b>										
	10 Ripristini platri e costoloni in c.a.			4.356	13.067	13.067	6.534	6.534		43,556.70	34.684%
<b>IV</b>	<b>Opere di completamento e finiture</b>										
	11 Esecuzione impermeabilizzazioni							2.041		2,040.54	1.625%
	12 Formazione canale di gronda e posa pluviali						0.900	0.720	0.180	1,800.90	1.434%
	13 Installazione dispositivi anticaduta in copertura						1.925	0.481		2,406.40	1.916%
	14 Ripristino dell'impianto altoparlante, elettrico, ecc.								0.330	330.00	0.263%
	15 Rimozione apprestamenti e cantiere (oneri sicurezza)								1.172	1,171.95	0.933%
	<i>Totale singolo periodo (migliaia di € arrot.)</i>	16.971	18.382	17.516	25.730	22.654	10.530	10.947	2.853	<b>125,583.15</b>	<b>100%</b>
	<i>Percentuale parziale</i>	13.51%	14.64%	13.95%	20.49%	18.04%	8.39%	8.72%	2.27%		
	<i>Percentuale progressiva</i>	13.51%	28.15%	42.10%	62.59%	80.63%	89.01%	97.73%	100.00%		
	<i>Importi progressivi (migliaia di € arrot.)</i>	16.971	35.353	52.869	78.599	101.253	111.783	122.730	125.583		

## Cronoprogramma dei lavori *(art. 40 D.P.R. 207/2010)*

- Istogramma degli importi progressivi -

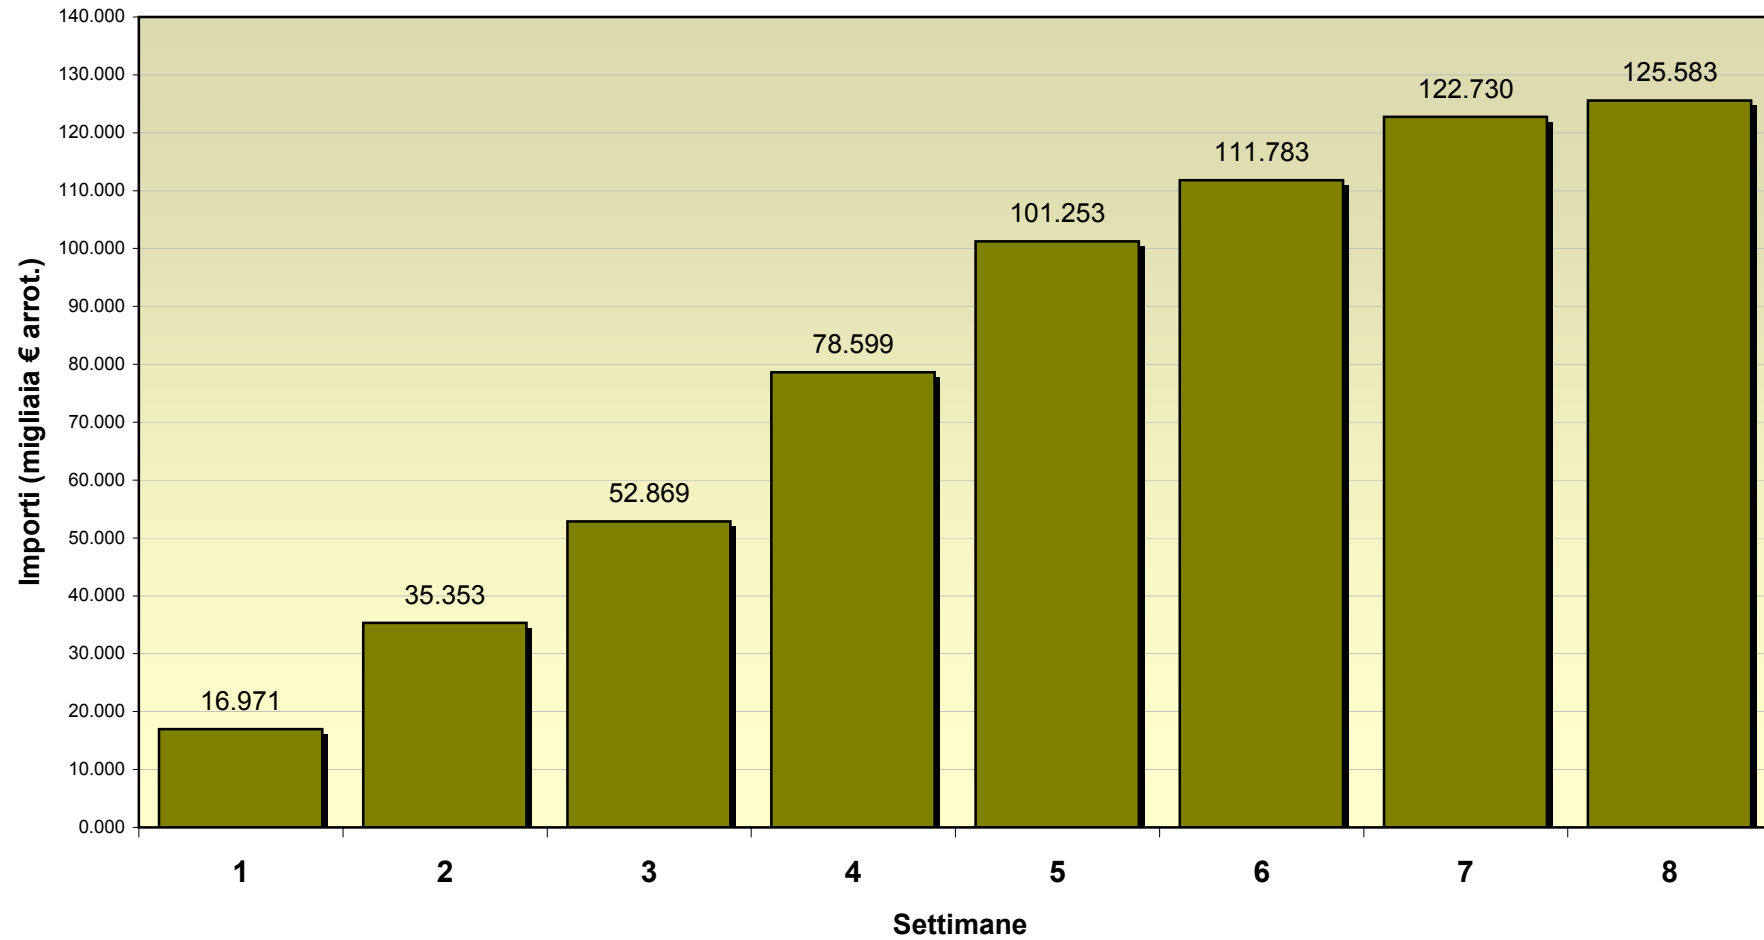

## Cronoprogramma dei lavori (art. 40 D.P.R. 207/2010)

- Segnalazione stati di avanzamento -

